

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue avant le 17 juin 2010

Exploitant : LGS

Site inspecté : ORANGE «Le Lampourdier et Maubuisson-est»

Date de l'inspection : 27 mai 2010

Constat de l'inspecteur :


Les escaliers permettant d'accéder aux installations en hauteur ne sont pas équipés d'une plinthe de 15 cm de hauteur

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

Écart aux dispositions de l'article 13 du titre « Travail et Circulation en hauteur » du R.G.I.E.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur




L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature


Rascal CROZET Responsable d'exploitation



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les plinthes seront mise en place au mois d'Aout, pendant l'arrêt des installations.

150 mm au dessus du limon.

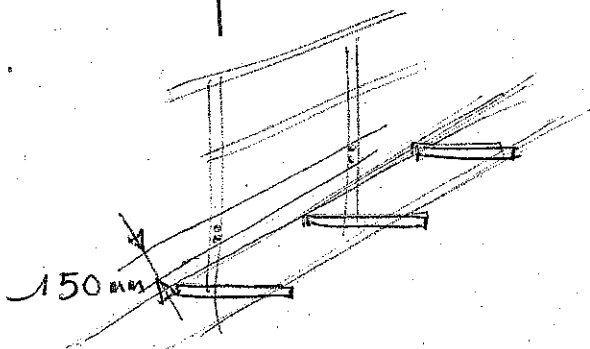

E
X
P
L
O
I
T
A
N
T

Suites susceptibles d'être données

- Écart levé Oui Non
- Proposition de mise en demeure Oui Non
- Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

L'inspection le :

Fiche soldée le :

D
R
E
A
L
